


CAMBIO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 2
CAMBIO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
CAMBIO CANTO FORJADO
MOTIVO MODIFICACIÓN

31-JULIO-2013	FECHA
01-FEBRERO-2013	
01-FEBRERO-2012	


3	Nº VERSIÓN
2	
1	

Bridge Technologies

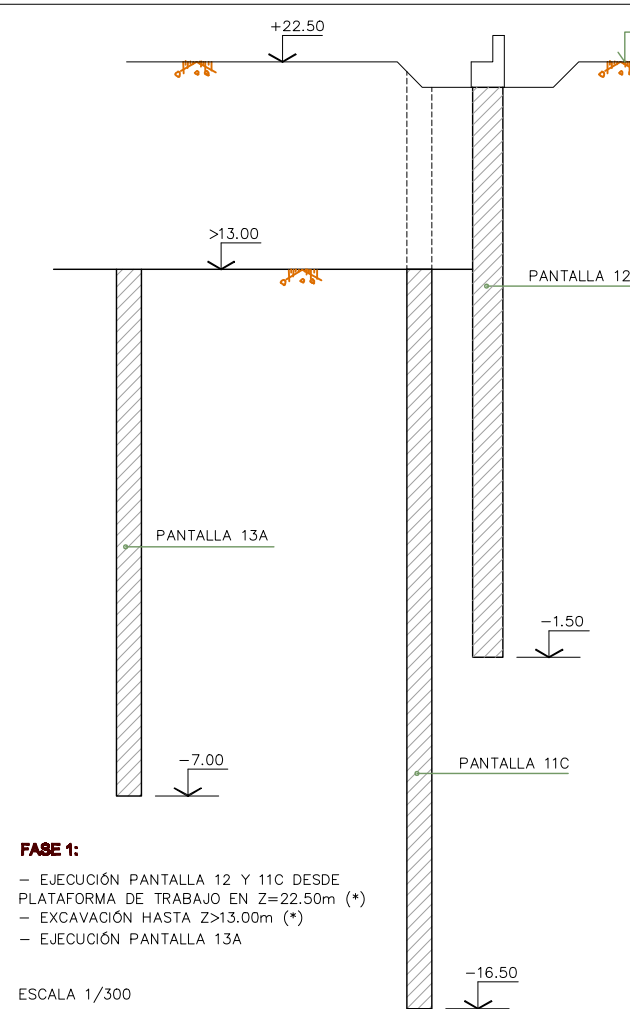


- FASE 1:**
- EJECUCIÓN PANTALLA 12 Y 11C DESDE PLATAFORMA DE TRABAJO EN Z=22.50m (*)
 - EXCAVACIÓN HASTA Z>13.00m (*)
 - EJECUCIÓN PANTALLA 13A

ESCALA 1/300

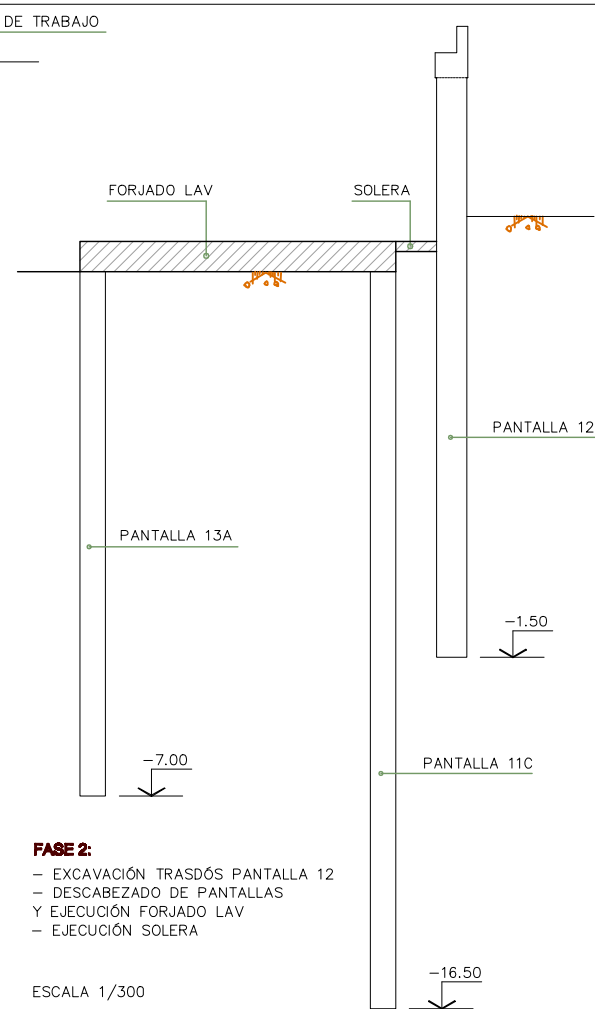


- FASE 2:**
- EXCAVACIÓN TRASDÓS PANTALLA 12
 - DESCABEZADO DE PANTALLAS
 - Y EJECUCIÓN FORJADO LAV
 - EJECUCIÓN SOLERA

ESCALA 1/300

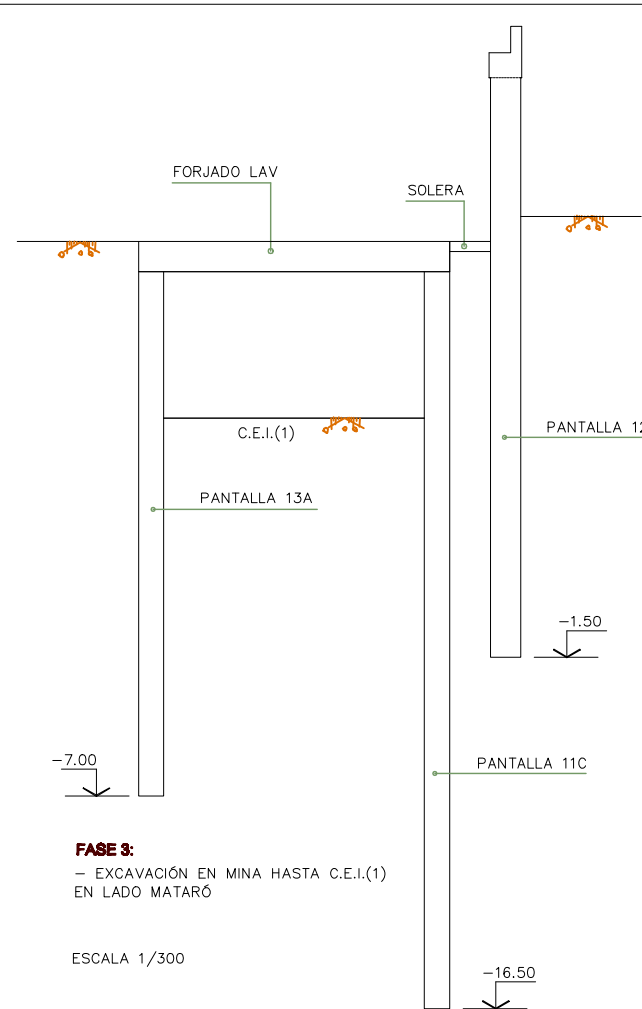


- FASE 3:**
- EXCAVACIÓN EN MINA HASTA C.E.I.(1) EN LADO MATARÓ

ESCALA 1/300

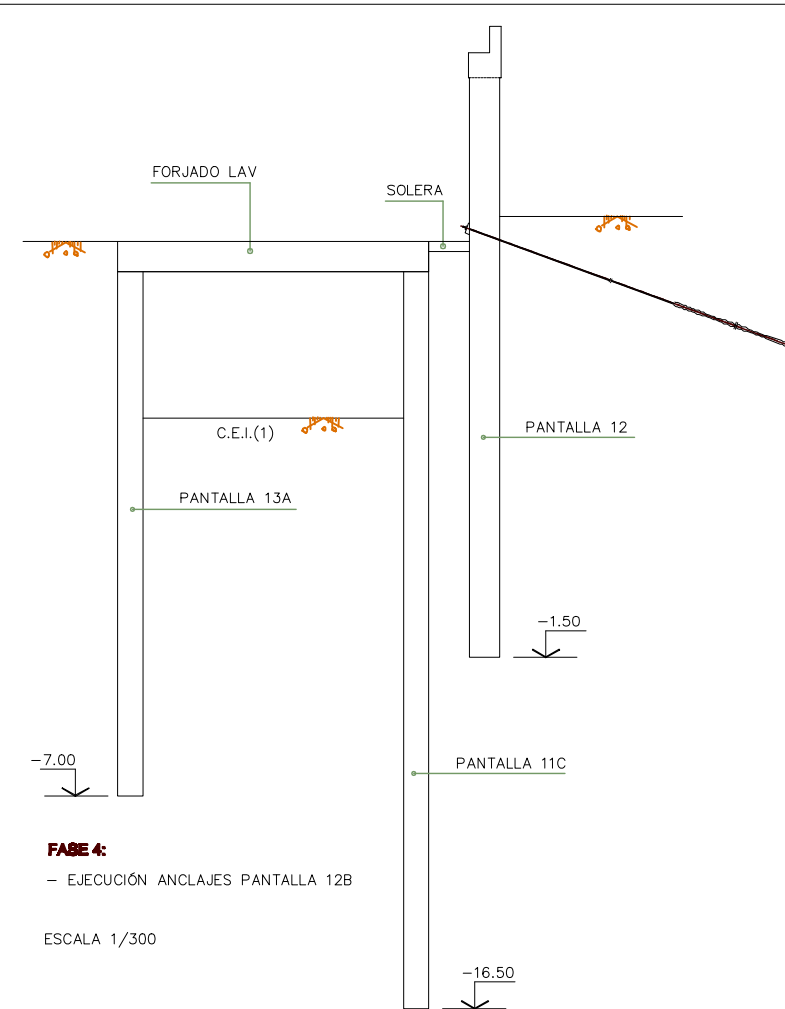


- FASE 4:**
- EJECUCIÓN ANCLAJES PANTALLA 12B

ESCALA 1/300

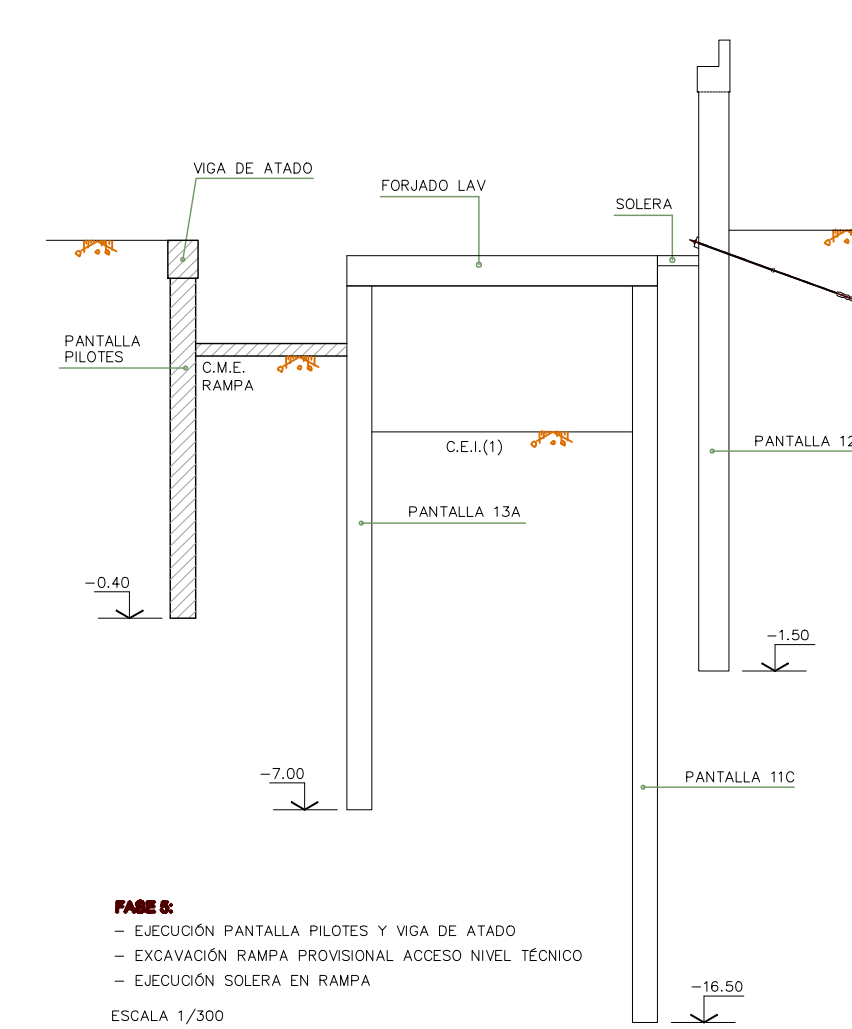


- FASE 5:**
- EJECUCIÓN PANTALLA PILOTES Y VIGA DE ATADO
 - EXCAVACIÓN RAMPA PROVISIONAL ACCESO NIVEL TÉCNICO
 - EJECUCIÓN SOLERA EN RAMPA

ESCALA 1/300

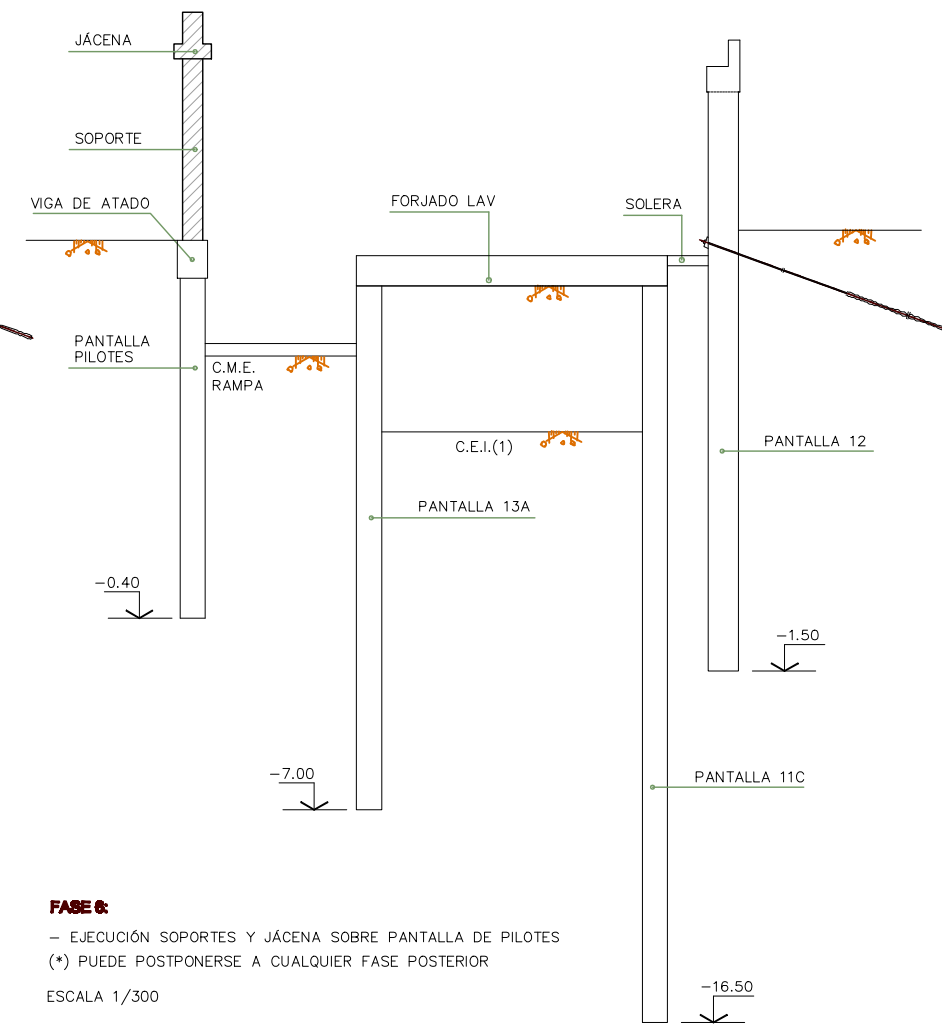

- FASE 6:**
- EJECUCIÓN SOPORTES Y JÁCENA SOBRE PANTALLA DE PILOTES (*) PUEDE POSTPONERSE A CUALQUIER FASE POSTERIOR

ESCALA 1/300

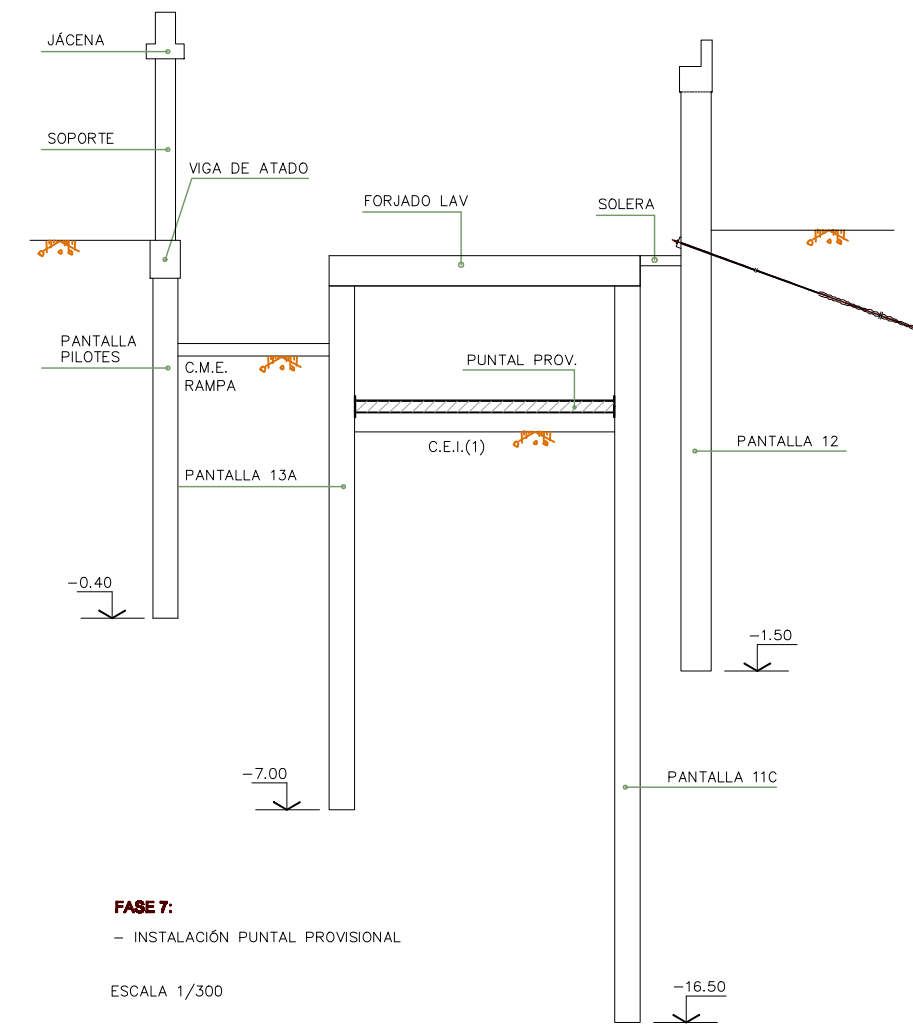

- FASE 7:**
- INSTALACIÓN PUNTA PROVISIONAL

ESCALA 1/300

TÍTULO
L.A.V. MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA
TRAMO: LA SAGRERA-NUDO DE LA TRINIDAD.
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ACCESOS
A LA ESTACIÓN DE LA SAGRERA.

AUTOR UTE ACCESOS ESTACIÓN DE LA SAGRERA



ESCALA

INDICADAS

Númérica

Gráfica



FECHA

31 JULIO. 2013


TÍTULO DEL PLANO

PANTALLA 13A
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO (I)
1+218.158 A 1+237.747

Nº DE PLANO

2.9.4.4.13.1

Hoja 4 de 5

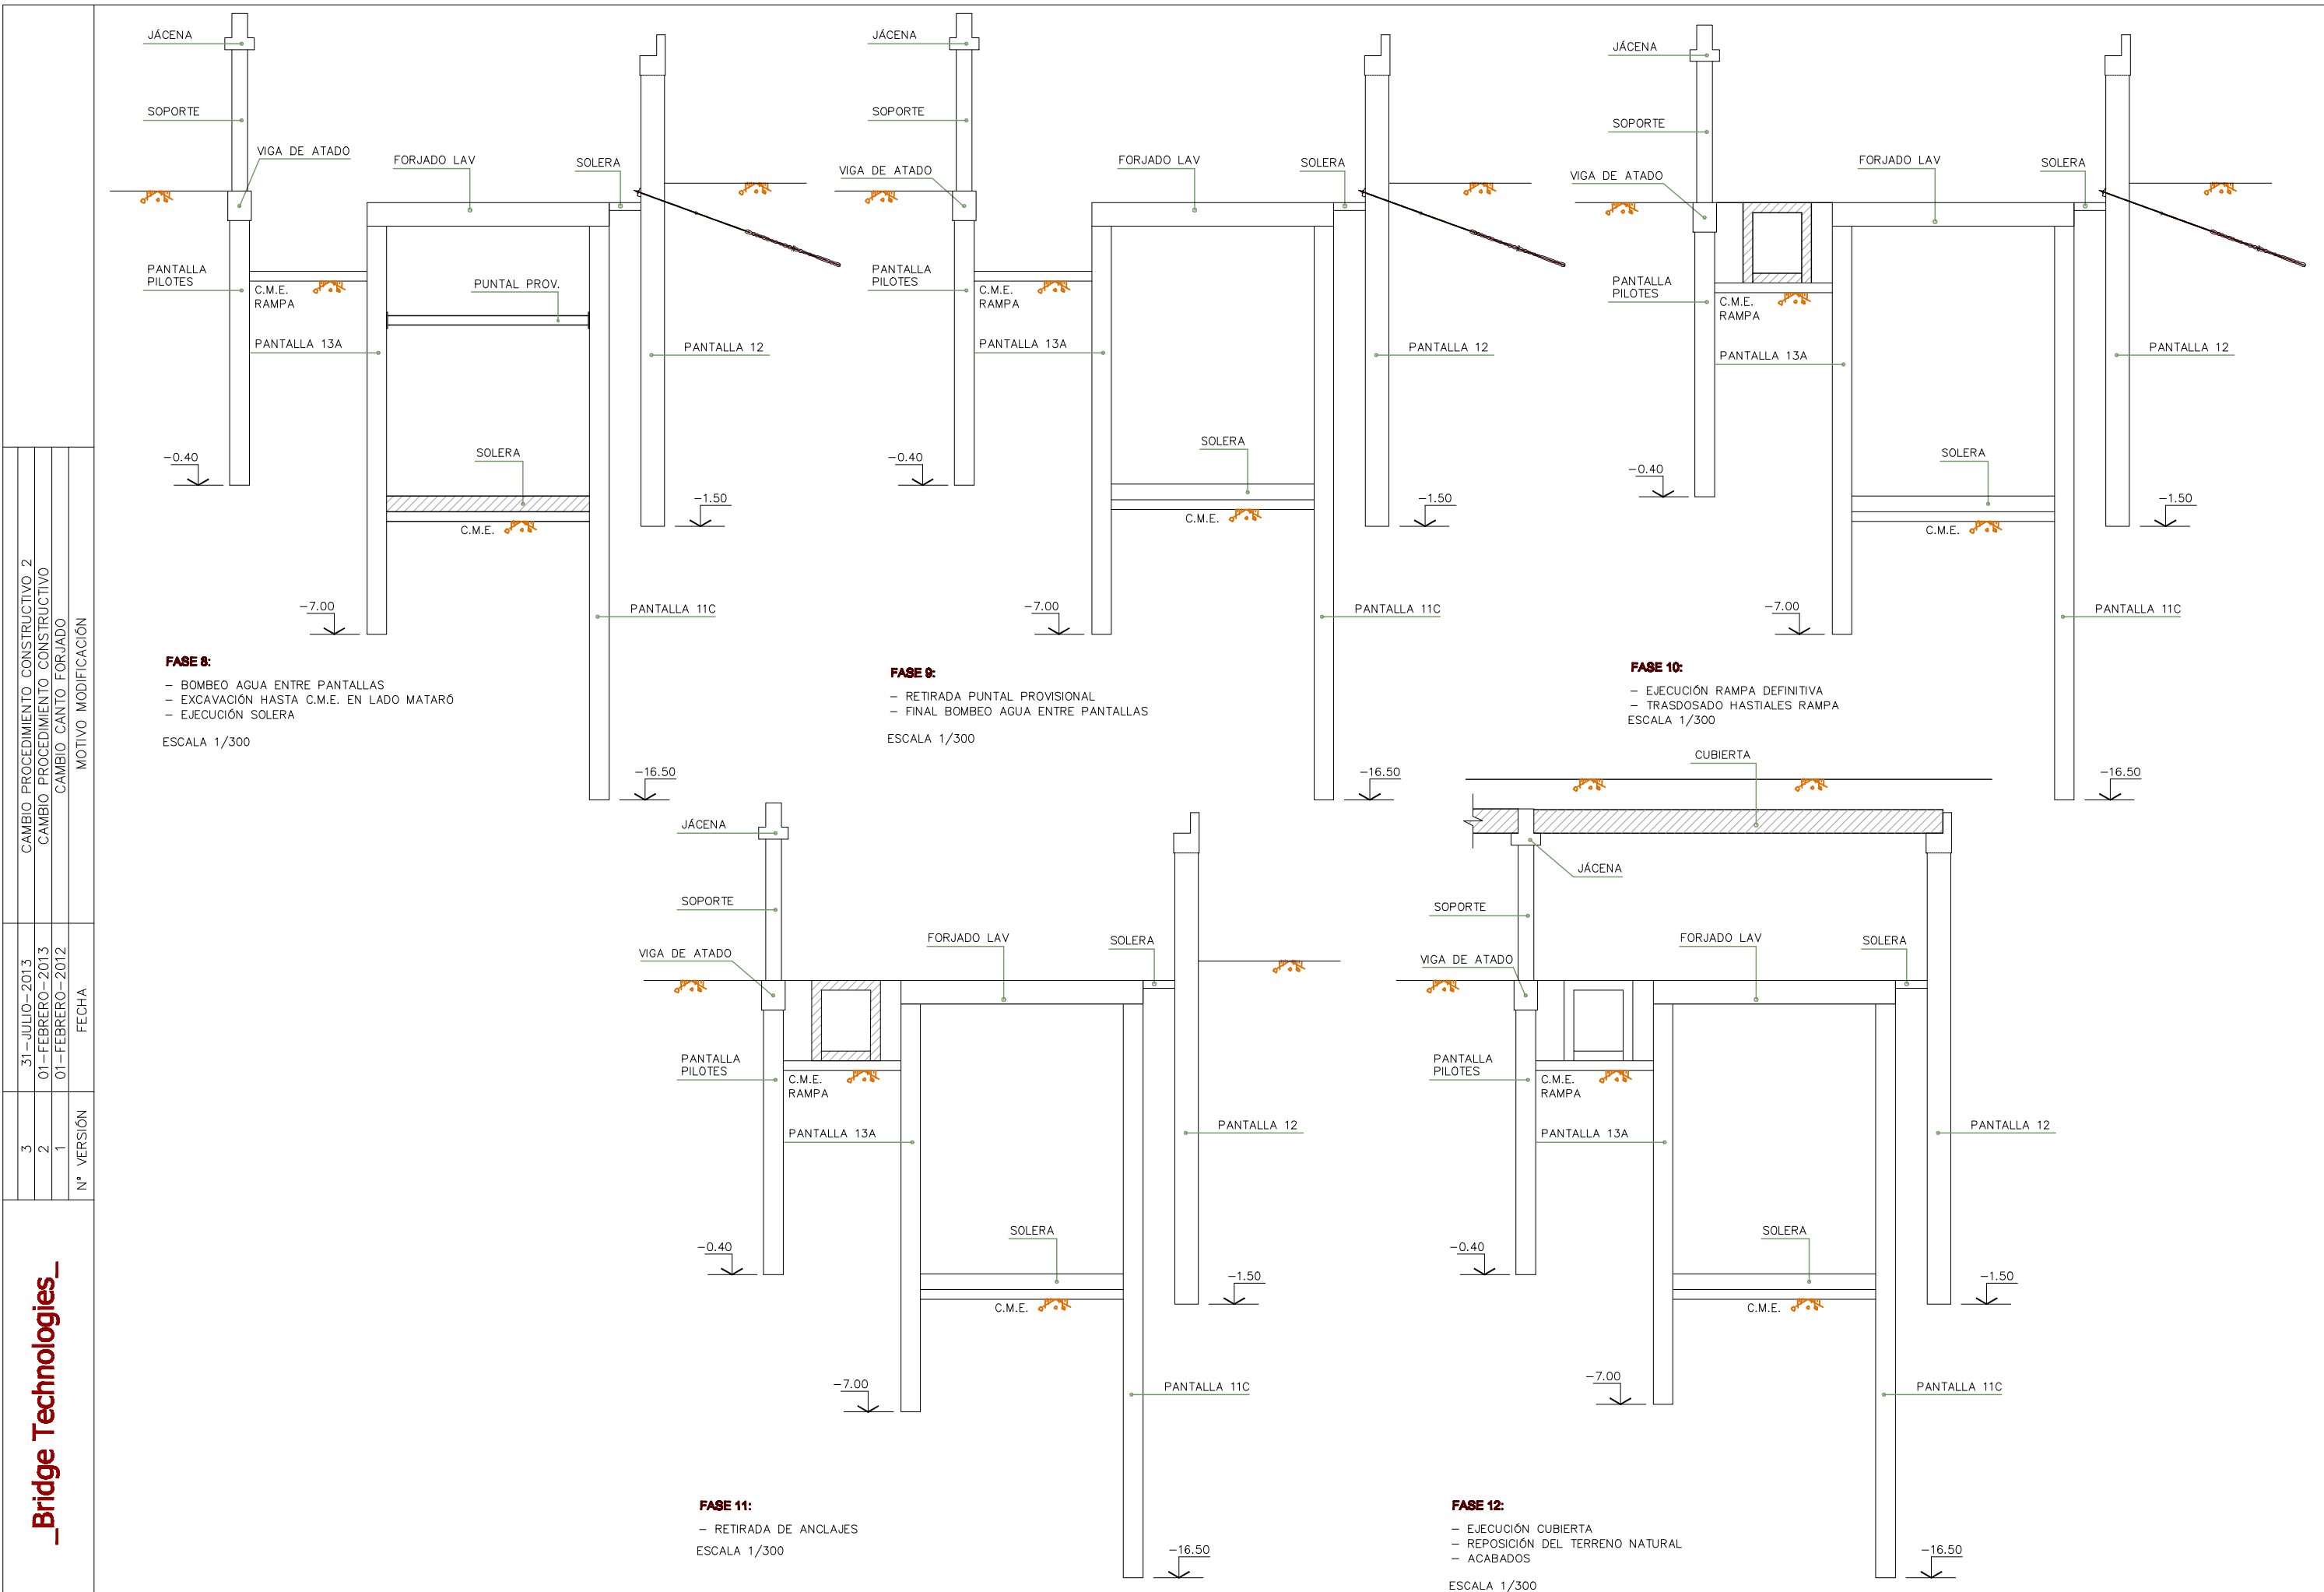

FASE 8:
 - BOMBEO AGUA ENTRE PANTALLAS
 - EXCAVACIÓN HASTA C.M.E. EN LADO MATARÓ
 - EJECUCIÓN SOLERA
 ESCALA 1/300

FASE 9:
 - RETIRADA PUNTAL PROVISIONAL
 - FINAL BOMBEO AGUA ENTRE PANTALLAS
 ESCALA 1/300

FASE 10:
 - EJECUCIÓN RAMPA DEFINITIVA
 - TRASDOSADO HASTIALES RAMPA
 ESCALA 1/300

FASE 11:
 - RETIRADA DE ANCLAJES
 ESCALA 1/300

FASE 12:
 - EJECUCIÓN CUBIERTA
 - REPOSICIÓN DEL TERRENO NATURAL
 - ACABADOS
 ESCALA 1/300

3	31-JULIO-2013	CAMBIO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 2
2	01-FEBRERO-2013	CAMBIO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
1	01-FEBRERO-2012	CAMBIO CANTO FORJADO
		MOTIVO MODIFICACIÓN

Bridge Technologies
